環状七号線地下広域調節池（石神井川区間）工事　週間工程表　【発進立坑】

月間安全衛生重点管理事項	工期	作成日
挟まれ・巻込まれ災害の防止	自：平成29年(2017年)3月9日 至：令和5年(2023年)3月14日	2021年1月7日 大成・鹿島・大林・京急建設共同企業体

場所	工種	昼夜区分	1月 4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	備　考
発進基地	**仮設工**																							
	仮設工	昼	休暇前養生復旧			桟橋上整備	仮セグ運搬（仮置場→発進）										杉並区ヤード整備				資材運搬(板橋区小茂→杉並区荻窪)			
	仮設電気工	昼					月例点検 冷却設備配線										P0配線							
	地盤変状測量	昼		地盤変状測量ポイント復旧																				
	運搬工	昼					仮セグ運搬														資材運搬(板橋区小茂→杉並区荻窪)			
	点検調査工																							
	点検調査工	昼 夜		点検調査工							点検調査工						点検調査工							
	シールド設備工																							
	プラント管理	昼											原水槽水抜き、沈砂槽清掃								設備点検			
	通信計測工	昼				架台設置					通信確認、仮セグ計測器設置、ひずみゲージ張替え									ロボテック配線・試運転				
	作泥工	昼			作泥		90m3(調整槽)								240m3(調整槽)					360m3(調整槽→原水槽)				
	流体設備管理	昼																P0配線、無負荷運転						
	泥水処理設備工	昼				トラックスケール点検																		
	揚重クレーン																							
	揚重クレーン 120tクローラクレーン	昼	資材揚重 ブームアップ								資材揚重						資材揚重							
	揚重クレーン 20tラフタークレーン	昼					仮セグ運搬										杉並仮置場	資材楊重相番						
	揚重クレーン 16tラフタークレーン	昼																			板橋仮置場	資材運搬相番		

1/ 11（月）～ 1/ 17（日）施工位置図

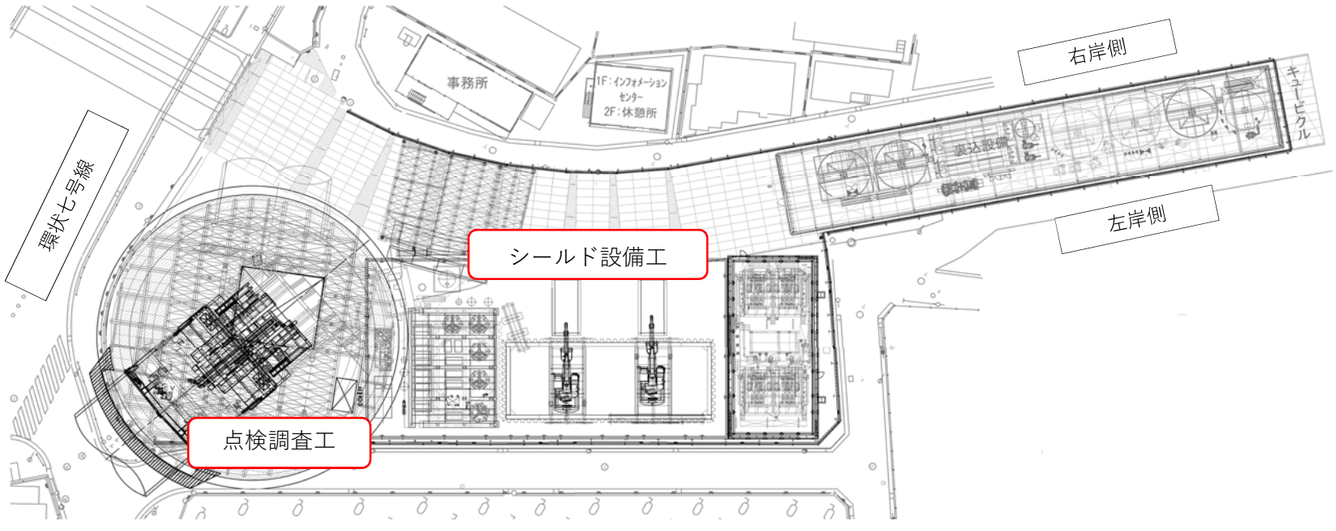

■問い合わせ先

東京都第三建設事務所 工事第二課 広域調節池工事担当
〒164-0001　東京都中野区中野4-8-1
TEL:03-3387-6251・6254
FAX:03-3387-8851
担当：伊藤(いとう)、浅見(あさみ)

大成・鹿島・大林・京急建設共同企業体
〒165-0034　東京都中野区大和町2-7
TEL:03-5356-7211
FAX:03-5356-7611
担当：新井(あらい)、田中(たなか)
